



Bilan de la Phase 2 du contrat de rivière Orb & Libron (2023-2024)

CLE du 13 Mars 2025



Contenu

- **Rappel du contenu du Contrat de Rivière 4 Orb et Libron (2020-2024)**
- **Avancement fin 2024**
- **Perspectives 2025**



Rappel du contenu du Contrat de Rivière 2020-2024 Orb Libron



Phase 1 du contrat de rivière (2020-2022) : principales conclusions du bilan

▶ Le Contrat de Rivière Orb-Libron 4 - 2020-2022 :

54 opérations pour ~14 M€

2020	2021	2022
3 564 680 €	9 093 700 €	1 487 333 €


▶ La stratégie retenue

- ▶ **Accompagner le besoin d'amélioration de la connaissance lié aux évolutions de la maîtrise d'ouvrage (assainissement, AEP)**
- ▶ **Résoudre les difficultés identifiées de longue date et notamment celles inscrites au PDM (quantitatif, hydromorphologie)**
- ▶ **Encourager/poursuivre les actions novatrices et pilotes (toxiques, gestion du temps de pluie, phytosanitaires, adaptation au changement climatique)**
- ▶ **Poursuivre l'accompagnement du territoire par des animations dédiées**



Phase 1 du contrat de rivière (2020-2022) : principales conclusions du bilan

- ▶ Un **bilan globalement positif** avec :
 - ▶ Un engagement de **9,4 M d'€ soit 66%** du montant programmé sur 2020-2022. *La non réalisation d'actions portées par des maîtres d'ouvrages privés du volet continuité et estimées à 4 M d'€ justifie ce résultat : hors continuité le taux d'engagement atteint 93%.*
 - ▶ En nombre d'actions, **83 % des actions programmées ont été engagées** et plus de la moitié d'entres elles sont terminées.

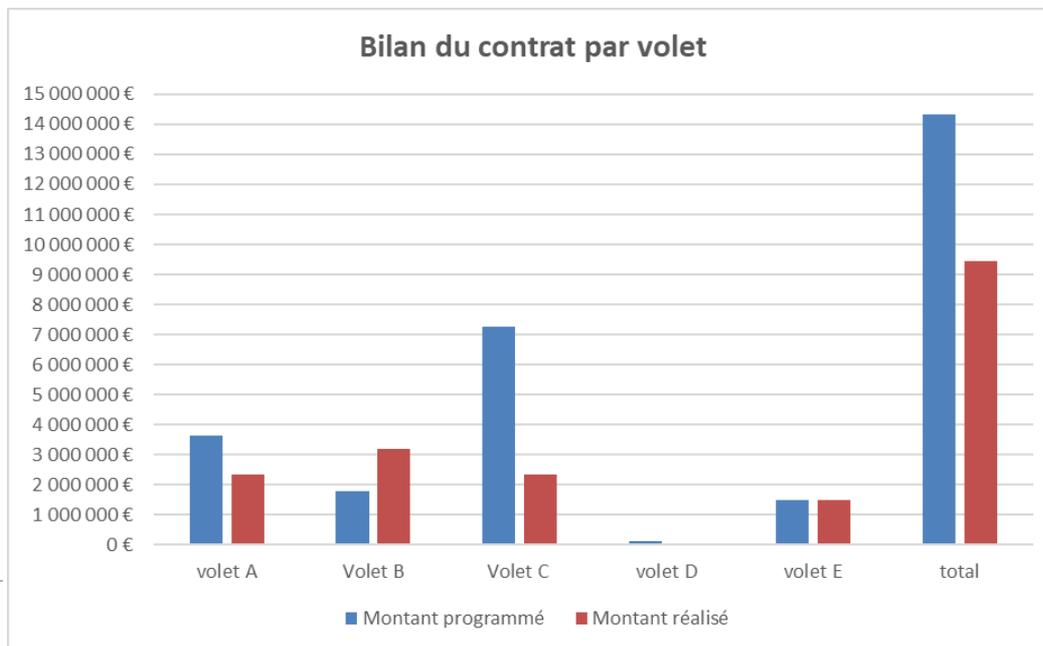

5 volets :

- ▶ A - Préservation de la qualité des eaux
- ▶ B- Gestion quantitative de la ressource en eau
- ▶ C- Préservation des cours d'eau et des milieux
- ▶ D- Adaptation au changement climatique
- ▶ E- Animation / mise en œuvre opérationnelle

Phase 2 : 2023-2024

- ▶ **Un programme riche de 58 actions pour un montant d'environ 37 M € (~10 M€ hors opération temps de pluie CABM)**

2023	2024
5 787 559 €	4 235 639 € 31 235 639 € <i>avec opération CABM</i>

- ▶ **Un programme ambitieux malgré une durée courte (<2ans)**
- ▶ **Des réponses aux problématiques identifiées par le PDM**
- ▶ **Des actions emblématiques (morphologie du Libron, gestion du temps de pluie, plan de gestion du delta de l'Orb) que le contrat permet de mettre en œuvre**
- ▶ **Des actions novatrices et pilotes** (gestion des espèces exotiques, adaptation au changement climatique) issues de la première phase du contrat
- ▶ **La poursuite des animations thématiques garantes de l'efficacité du contrat.**

Le programme d'actions 2023-2024

Volet	Sous Volet	Nombre de fiches d'actions
A – Préservation de la qualité	Assainissement et Gestion du temps de pluie	2
	Pollutions par les phytosanitaires	3
	Pollutions par les toxiques	1
B – Gestion quantitative	Gestion de l'Eau Potable	1
	Gestion de l'Eau Brute	1
	Amélioration de la connaissance	1
C – Préservation et restauration des Milieux	Continuité écologique	1
	Gestion de la ripisylve	2
	Restauration morphologique des cours d'eau	3
	Zones humides	1
D – Contribution à l'adaptation au Changement Climatique		2
E – Animation du contrat de rivière		1
Total		19

	Volet A	Volet B	Volet C	Volet D	Volet E	Total
Montant programmé	31 903 000 €	570 000 €	2 842 317 €	737 272 €	970 609 €	37 023 198 €





Avancement fin 2024 de la phase 2 du Contrat de Rivière 2020-2024 Orb Libron




Synthèse fin 2024

Un bon niveau d'engagement des actions programmées


	Montant	Avancement /programmation	Nombre d'opérations	Avancement /programmation
Engagé fin 2024	8 238 223 €	82 %	43	74%

Engagement financier fin 2024

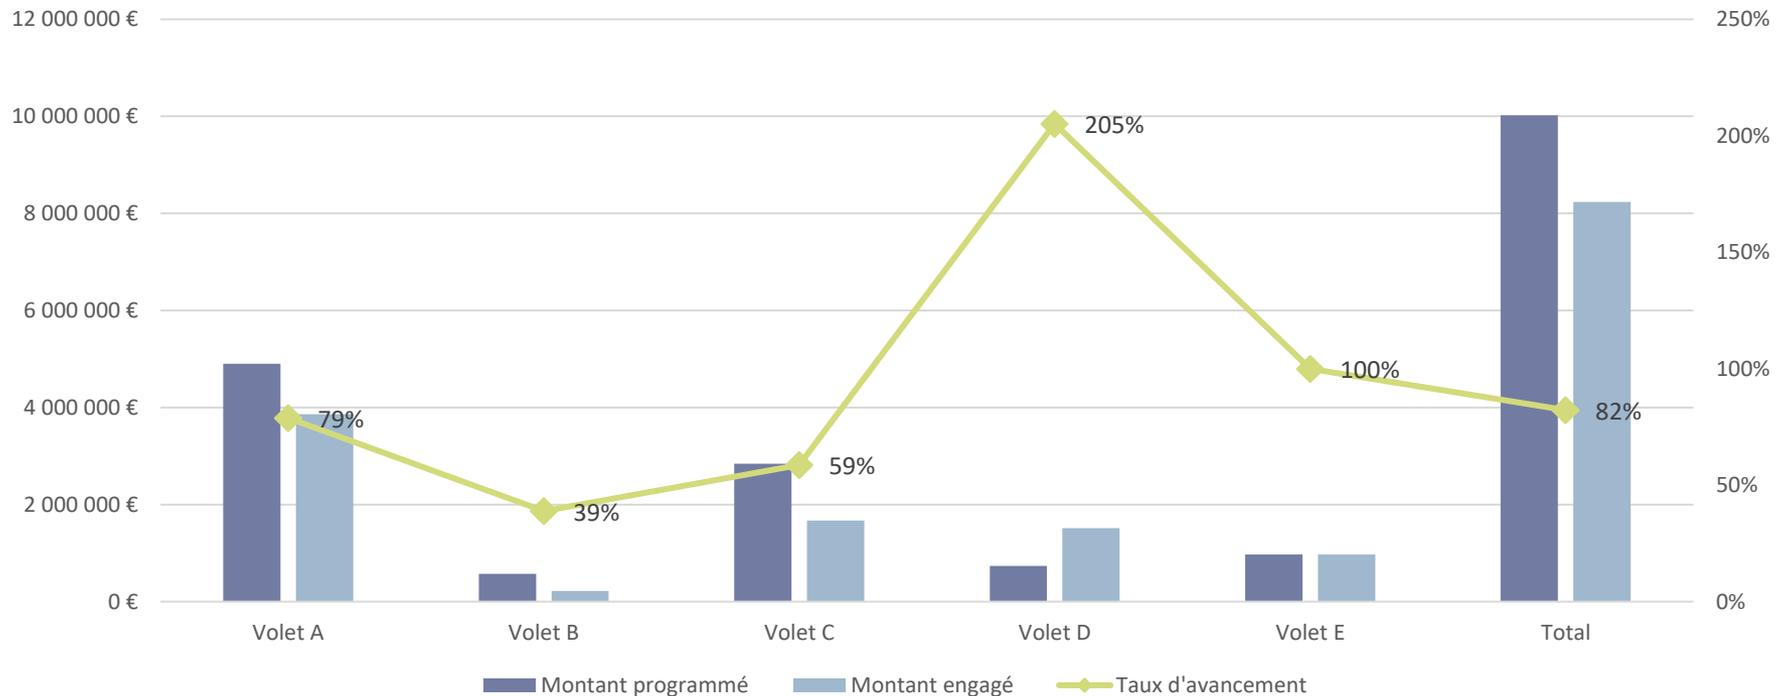

Synthèse fin 2024

Avancement en nombre d'actions

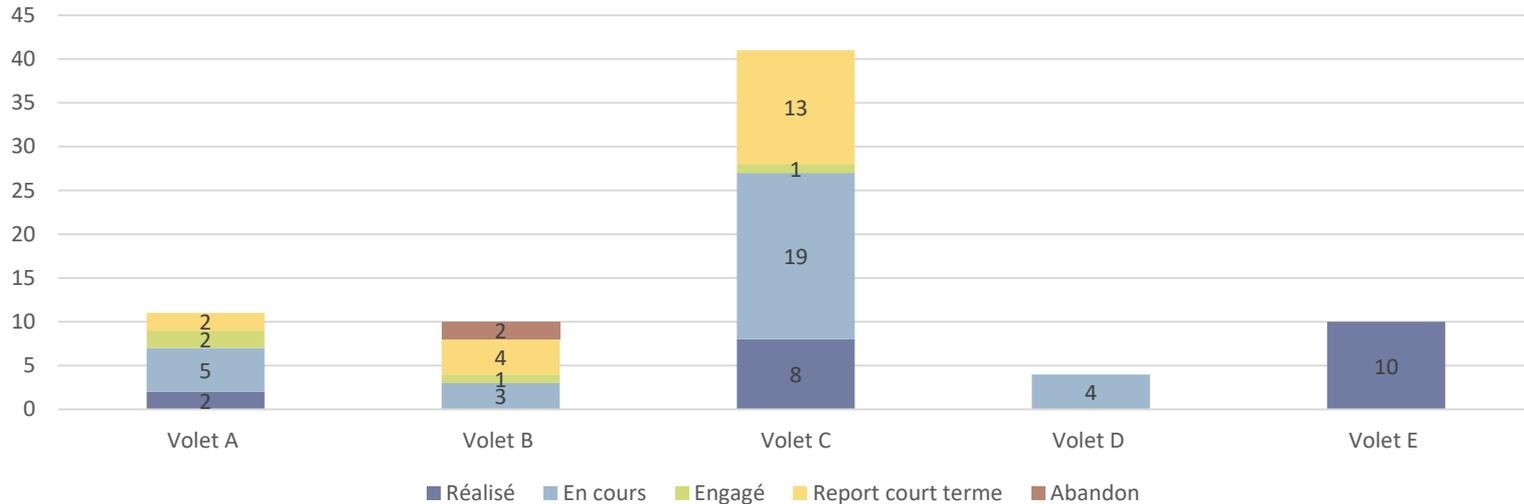

Aides exceptionnelles obtenues grâce au contrat de rivière:

Les actions « petit cycle » inscrites au contrat permettent aux maitres d'ouvrage de bénéficier d'une subvention pour d'autres actions petit cycle non éligibles aux aides de l'Agence de l'eau :

	Opérations	Coût prévisionnel Opération	Montant Assiette retenu	Montant aide retenu
Eau potable	4	743 685 €	743 685 €	214 705 €
Assainissement	6	1 847 060 €	882 506 €	246 774 €

Volet A Préservation de la qualité des eaux

Orientations prioritaires	Opération	Maître d'ouvrage	Coût € HT	Année	N° fiche action	Avancement	Montant si différent du prévisionnel
Assainissement et gestion du temps de pluie	Réhabilitation réseaux EU traversée Laurens - Tranche 2	SI Mare et Libron	pm	2023	A1	Réalisé	
	Réhabilitation de réseau - Cazouls-lès-Béziers	SIVOM Orb et Vernazobres	800 000 €	2024	A1	Report court terme	
	Résorption des rejets individuels diffus sur l'îlot Port Neuf à Béziers	CABM	600 000 €	2023	A1	Réalisé	675 140
	Réalisation des ouvrages prioritaires de gestion du temps de pluie - Bassin d'orage en amont de la station d'épuration de Béziers - Tranche ferme : 17,7 M€ et Tranche optionnelle 1 (rive droite) : 4 M€	CABM	21 700 000 €	2024	A2	Engagé	22 308 550
	Réalisation des ouvrages prioritaires de gestion du temps de pluie - Travaux réseau en amont du bassin d'orage de la station d'épuration de Béziers - Tranche ferme	CABM	5 300 000 €	2024	A2	Report court terme	
	Etude de faisabilité d'opérations de désimperméabilisation sur des secteurs prioritaires (réseaux unitaires raccordés à la STEP de Béziers)	CABM	50 000 €	2023	A2	En cours	60 000
Phytosanitaires	Délimitation de l'aire d'alimentation du captage prioritaire Creissan	Creissan	70 000 €	2023	A3	En cours	
	Délimitation de l'aire d'alimentation du captage prioritaire Perdiguier	SIVOM Ensérune	70 000 €	2023	A3	Engagé	56 800
	Bouchage des piézomètres ou forages non utilisés sur l'AAC du Libron et les zones de sauvegarde de la nappe alluviale de l'Orb	CABM	120 000 €	2023	A4	En cours	155 000
	Mise en place d'un traitement des pesticides sur les communes de Puimisson-Puissalicon	CCAM	2 921 000 €	2023	A5	En cours	2 773 150
Toxiques	Mise en œuvre du plan d'actions rejets industriels et toxiques	CABM - acteurs économiques	182 000 €	2023	A6	Réalisé	11 828
	Mise en œuvre du plan d'actions rejets industriels et toxiques	CABM - acteurs économiques	90 000 €	2024	A6	En cours	132 915

Volet B Gestion quantitative de la ressource en eau

Orientations prioritaires	Opération	Maître d'ouvrage	Typologie	Coût € HT	Année	N° fiche action	Avancement	Montant si différent du prévisionnel
Eau Potable	Mise en œuvre des schémas directeurs engagés durant la première phase (cf PGRE 5,6 millions d'Euros)		travaux	pm	2023-2024	B7	En cours	
	Pose de compteurs de sectorisation et généralisation de la télésurveillance - Le Bousquet, Lunas	SI d'assainissement et d'eau de l'Orb et du Gravezon	travaux	160 000 €	2024	B7	Abandonné	
Eau brute	PGRE - Travaux béals du Jaur (béal de Courmiou)	Béal de Courmiou	travaux	30 000 €	2023	B8	Engagé	25 000
	PGRE - Travaux béals du Jaur (béal de la SCI Chalion)	SCI Chalion	travaux	20 000 €	2023	B8	Report court terme	32 000
	PGRE - Travaux béals du Jaur	M Massart	travaux	40 000 €	2023	B8	Report court terme	13 000
	PGRE - Travaux béals du Jaur	SCI nouveau Martinet	travaux	20 000 €	2023	B8	Report court terme	
	PGRE - Travaux béals du Vernazobre (béal de la mairie, prise de la Boriasse)	ASA Illouvre Vernazobres	travaux	15 000 €	2023	B8	Report court terme	
	PGRE - Travaux béals du Vernazobre - Mise en pression du réseau gravitaire	Particulier La Dournie	travaux	85 000 €	2024	B8	Abandonné	
Connaissance	Etude sur le lien fonctionnel entre karst et eaux superficielles forage de Commeyras	EPTB OL	étude	100 000 €	2024	B9	En cours	91 500
	Etude sur le lien fonctionnel entre karst et eaux superficielles forage de Lacans	EPTB OL	étude	100 000 €	2024	B9	En cours	105 100

- ▶ **Des premières actions d'économies d'eau** issues des Schémas Directeurs lancés lors de la première phase du contrat : SI Mare et Libron, Graissessac, La Tour sur Orb, Vieussan et Mons-la-Trivalle pour ~ 290 000 m³ économisés/an

Volet C

Préservation des cours d'eau et des milieux

Orientations prioritaires	Opération	Maitre d'ouvrage	Typologie	Coût € HT	Année	N° fiche action	Avancement	Montant si différent du prévisionnel
Continuité - Evaluation de l'efficacité des ouvrages assurant la continuité écologique sur l'Orb aval et moyen	Analyse de l'évolution du profil en long (du pont Gaston Doumergue à Béziers)	EPTB OL	étude	50 000 €	2023	C10	En cours	70 000
	Analyse de l'attractivité des passes à poissons du Moulin de Saint Pierre et Pont Rouge et préconisations	OFB	étude	pm	2023	C10	En cours ?	
	Topographie complémentaire sur les 5 passes à poissons	EPTB OL	étude	10 000 €	2023	C10	Report court terme	
	Mise en oeuvre de 2 dispositifs de comptage des espèces migratrices (Saint Pierre et Pont Rouge)	EPTB OL	travaux	140 000 €	2024	C10	Report court terme	
Gestion de la végétation des berges (GEMAPI item 2 délégué pour CESH, CCAM, CABM, CCLD)	Plan pluriannuel d'entretien des berges CCAM	EPTB OL	travaux	164 000 €	2023-2024	C11	Réalisé	
	Plan pluriannuel d'entretien des berges CCLD	EPTB OL	travaux	60 000 €	2023-2024	C11	Réalisé	
	Plan pluriannuel d'entretien des berges CCGO	CCGO	travaux	600 000 €	2023-2024	C11	Réalisé	
	Plan pluriannuel d'entretien des berges CAHM	CAHM	travaux	60 000 €	2023-2024	C11	Réalisé	
	Plan pluriannuel d'entretien des berges CCMC	CCMC	travaux	230 000 €	2023-2024	C11	Engagé	
	Plan pluriannuel d'entretien des berges Lirou, Vernazobre, Orb - CESH	EPTB OL	travaux	140 000 €	2023-2024	C11	Réalisé	
	Plan pluriannuel d'entretien des berges de l'Orb - CABM	EPTB OL	travaux	300 000 €	2023-2024	C11	Réalisé	
	Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - communication	EPTB OL	étude	30 000 €	2023	C12	Engagé	35 870
	Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - lutte contre la Berce	CCGO	travaux	40 000 €	2023	C12	Réalisé	- €
	Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - Limitation des déplacements des populations d'écrevisses exotiques sur les secteurs favorables aux populations d'écrevisses à pattes blanches	EPTB OL	travaux	12 000 €	2023	C12	Report indéterminé	
	Mise en œuvre du plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - Opération renouée	CCGO	travaux	20 000 €	2023	C12	Report court terme	
Compléments au plan d'actions stratégique de gestion des Espèces Exotiques et Envahissantes - Inventaire de la population de Cistudes secteur step Cazedarnes et moyenne vallée	EPTB OL	étude	14 950 €	2023	C12	En cours		

Volet C Préservation des cours d'eau et des milieux

Orientations prioritaires	Opération	Maître d'ouvrage	Typologie	Coût € HT	Année	N° fiche action	Avancement	Montant si différent du prévisionnel
Morphologie	Restauration morphologique Libron - Tranche 1	CCAM ou EPTB OL	travaux	100 000 €	2024	C13	Report court terme	
	Restauration morphologique Libron - Tranche 1	CAHM ou EPTB OL	travaux	65 000 €	2024	C13	Report court terme	
	Restauration morphologique Libron - Tranche 1	CABM ou EPTB OL	travaux	181 367 €	2024	C13	Report court terme	
	Travaux suite étude morpho Orb - secteur du Poujol sur Orb OBa4 – Réduire les contraintes hydrauliques qui menacent les enjeux sur le secteur du Poujol	CCGO	travaux	200 000 €	2024	C14	Report court terme	
	Accompagnement / Mise en œuvre étude espace de bon fonctionnement Orb et Libron	EPTB OL	étude	30 000 €	2023	C15	Report court terme	
Zones humides	Mise en œuvre plan de gestion du Delta - travaux de restauration hydraulique des fossés structurants tranche 1 - Sérignan	ASA Sérignan	travaux	85 000	2023	C16	En cours	
	Mise en œuvre plan de gestion du Delta - travaux de restauration hydraulique des fossés structurants tranche 1 - Portiragnes	ASA Portiragnes	travaux	85 000	2023	C16	En cours	
	Mise en œuvre plan de gestion du Delta - amélioration du ressuyage de la zone des Orpellières Hautes	CABM	travaux	145 000 €	2024	C16	En cours	
	Mise en œuvre plan de gestion du Delta - réhabilitation de la station de pompage des Drilles - avant projet	ASA Sérignan	étude	30 000 €	2024	C16	En cours	38 400

Volet D Contribution à l'adaptation au changement climatique

Opération	Maître d'ouvrage	Coût € HT	Année	N° fiche action	Avancement	Montant si différent du prévisionnel
Etude prospective permettant d'intégrer l'anticipation du changement climatique dans la gestion quantitative de la ressource	EPTB OL	300 000 €	2024	D17	En cours	245 000
Travaux de désimperméabilisation des écoles primaire et maternelle à Portiragnes	Portiragnes	237 272 €	2024	D18	En cours	985 631 €
Travaux de désimperméabilisation du parking Place du 14 juillet à Portiragnes (dont étude projet)	Portiragnes	200 000 €	2024	D18	En cours	
Mise en œuvre plan de gestion du Delta - réflexion sur l'adaptation des activités à la salinisation du secteur du delta de l'Orb	EPTB OL	50 000 €	2024	C16	En cours	

- AMI eau et changement climatique : réflexion sur le Faugérois et le delta de l'Orb portée par l'EPTB Orb Libron en partenariat avec les acteurs professionnels (mise en œuvre 2024-2025 pour un montant de 282 000 euros)

- des projets communaux de désimperméabilisation des cours d'école (Béziers, Bédarieux) bien engagés



Volet E Animation

Opération	Maître d'ouvrage	Coût € HT	Année	N° fiche action	Avancement	Montant si différent du prévisionnel
Animation Zones humides, restauration hydromorphologique et continuité (1 ETP)	EPTB OL	54 000 €	2023	E19	Réalisé	
Animation Zones humides, restauration hydromorphologique et continuité (1 ETP)	EPTB OL	54 000 €	2024	E19	Réalisé	
Animation Captages prioritaires Libron et Murviel (1 ETP)	EPTB OL	38 000 €	2023	E19	Réalisé	9 500
Animation Captages prioritaires Libron et Murviel (1 ETP)	EPTB OL	38 000 €	2024	E19	Réalisé	
Animation Captages prioritaires Puisserguier	Puisserguier	35 000 €	2023	E19	Réalisé	
Animation Captages prioritaires Puisserguier	Puisserguier	35 000 €	2024	E19	Réalisé	57 200
Animation agri-environnementale Orb Libron en lien avec les captages prioritaires	EPTB OL	54 000 €	2023	E19	Réalisé	
Animation agri-environnementale Orb Libron en lien avec les captages prioritaires	EPTB OL	54 000 €	2024	E19	Réalisé	
Animation restauration hydromorphologique et entretien des berges (1 ETP)	EPTB OL	52 000 €	2023	E19	Réalisé	
Animation restauration hydromorphologique et entretien des berges (1 ETP)	EPTB OL	52 000 €	2024	E19	Réalisé	
Poursuite animation rejets industriels	CABM	45 609 €	2023	E19	Réalisé	53 100
Poursuite animation rejets industriels	CABM	25 000 €	2024	E19	Réalisé	
Animation PGRE volet Eau brute + suivi des étiages (1 ETP)	EPTB OL	41 000 €	2023	E19	Réalisé	
Animation PGRE volet Eau brute + suivi des étiages (1 ETP)	EPTB OL	41 000 €	2024	E19	Réalisé	
Animation PGRE Volet AEP (1/2 ETP)	EPTB OL	20 000 €	2023	E19	Réalisé	
Animation PGRE Volet AEP (1/2 ETP)	EPTB OL	20 000 €	2024	E19	Réalisé	
Animation SAGE, inter SAGE, lien avec l'urbanisme (1 ETP)	EPTB OL	91 000 €	2023	E19	Réalisé	
Animation SAGE, inter SAGE, lien avec l'urbanisme (1 ETP)	EPTB OL	91 000 €	2024	E19	Réalisé	
Pilotage contrat de rivière et animation programme d'action (1 ETP)	EPTB OL	65 000 €	2023	E19	Réalisé	
Pilotage contrat de rivière et animation programme d'action (1 ETP)	EPTB OL	65 000 €	2024	E19	Réalisé	

Points à retenir du bilan fin 2024

- ▶ **Un programme ambitieux pour les deux dernières années qui s'est avéré néanmoins réaliste :**
 - ▶ La grande majorité des actions a été engagée
 - ▶ Les actions non engagées ont avancé techniquement
- ▶ **Des actions emblématiques** (Orb 2050, gestion du temps de pluie, plan de gestion du delta de l'Orb) **que le contrat permet de mettre en œuvre**
- ▶ **Un volet adaptation au changement climatique**
- ▶ **Des animations thématiques garantes de l'efficacité du contrat.**

Efficacité au regard des objectifs du PDM:

Sur les 55 actions programmées sur la phase 2, 20 répondent directement aux enjeux du PDM et parmi elles :

- 13 ont été engagées,
- les 7 autres sont prévues à court terme : définies techniquement, avec un objectif de réalisation entre 2025 et 2026 pour la majorité.





Perspectives 2025



Perspectives 2025

- ▶ **Vers un prochain contrat « Eau et Milieux » en lien avec le XIIème programme de l'Agence de l'Eau ?**
- ▶ **Préalables :**
 - ▶ **Elaborer un bilan technico-financier du contrat**
 - ▶ **Actualiser l'état des lieux du bassin versant**
 - ▶ **Intégrer les éléments issus des autres démarches en cours : principalement Etude Orb 2050, bilan-évaluation du Plan de Gestion de la Ressource en Eau, mais aussi études Karst, bilan-évaluation de la stratégie du programme d'action des captages prioritaires du Libron...**
- ▶ **Objectif : définir un nouveau programme d'actions opérationnel début 2026**





Bilan de la Phase 2 du Contrat de Rivière 2020-2024 Orb & Libron

Merci de votre attention

